CBR 04/15/2009
VERTICAL CYLINDER

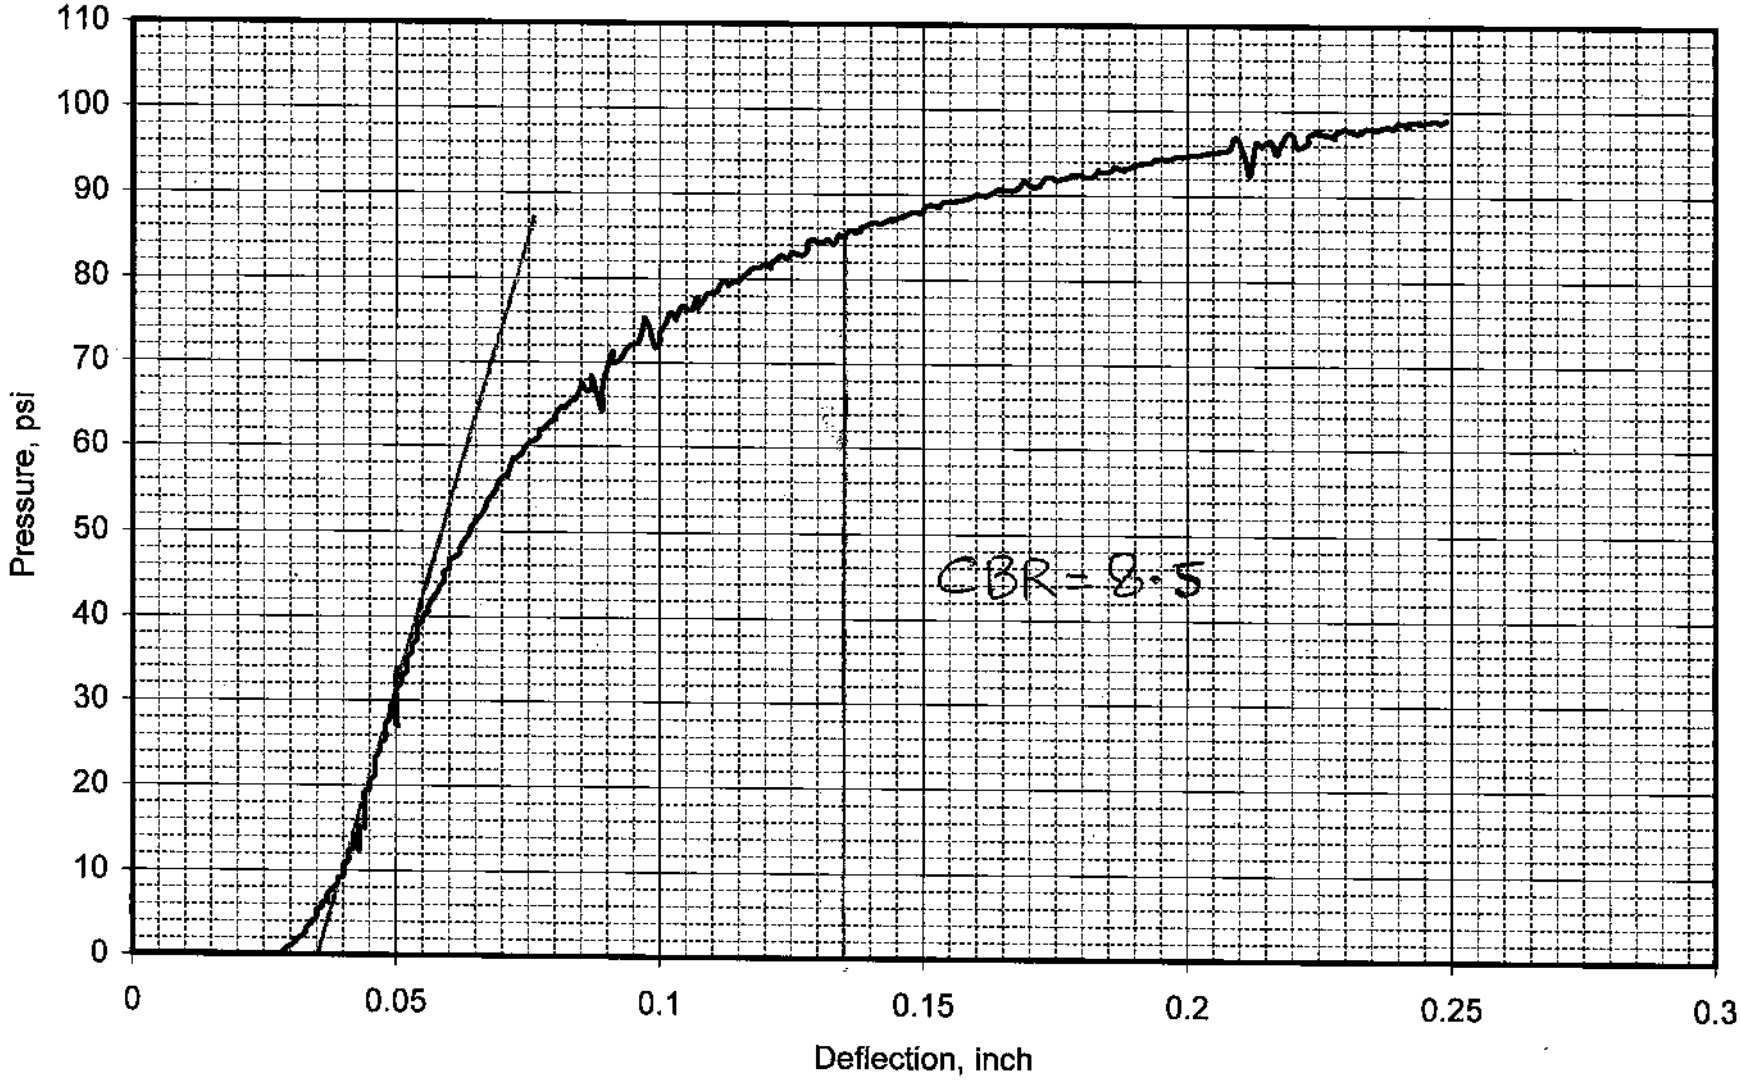

CBR 04/15/2009
CYLINDER HORIZONTAL

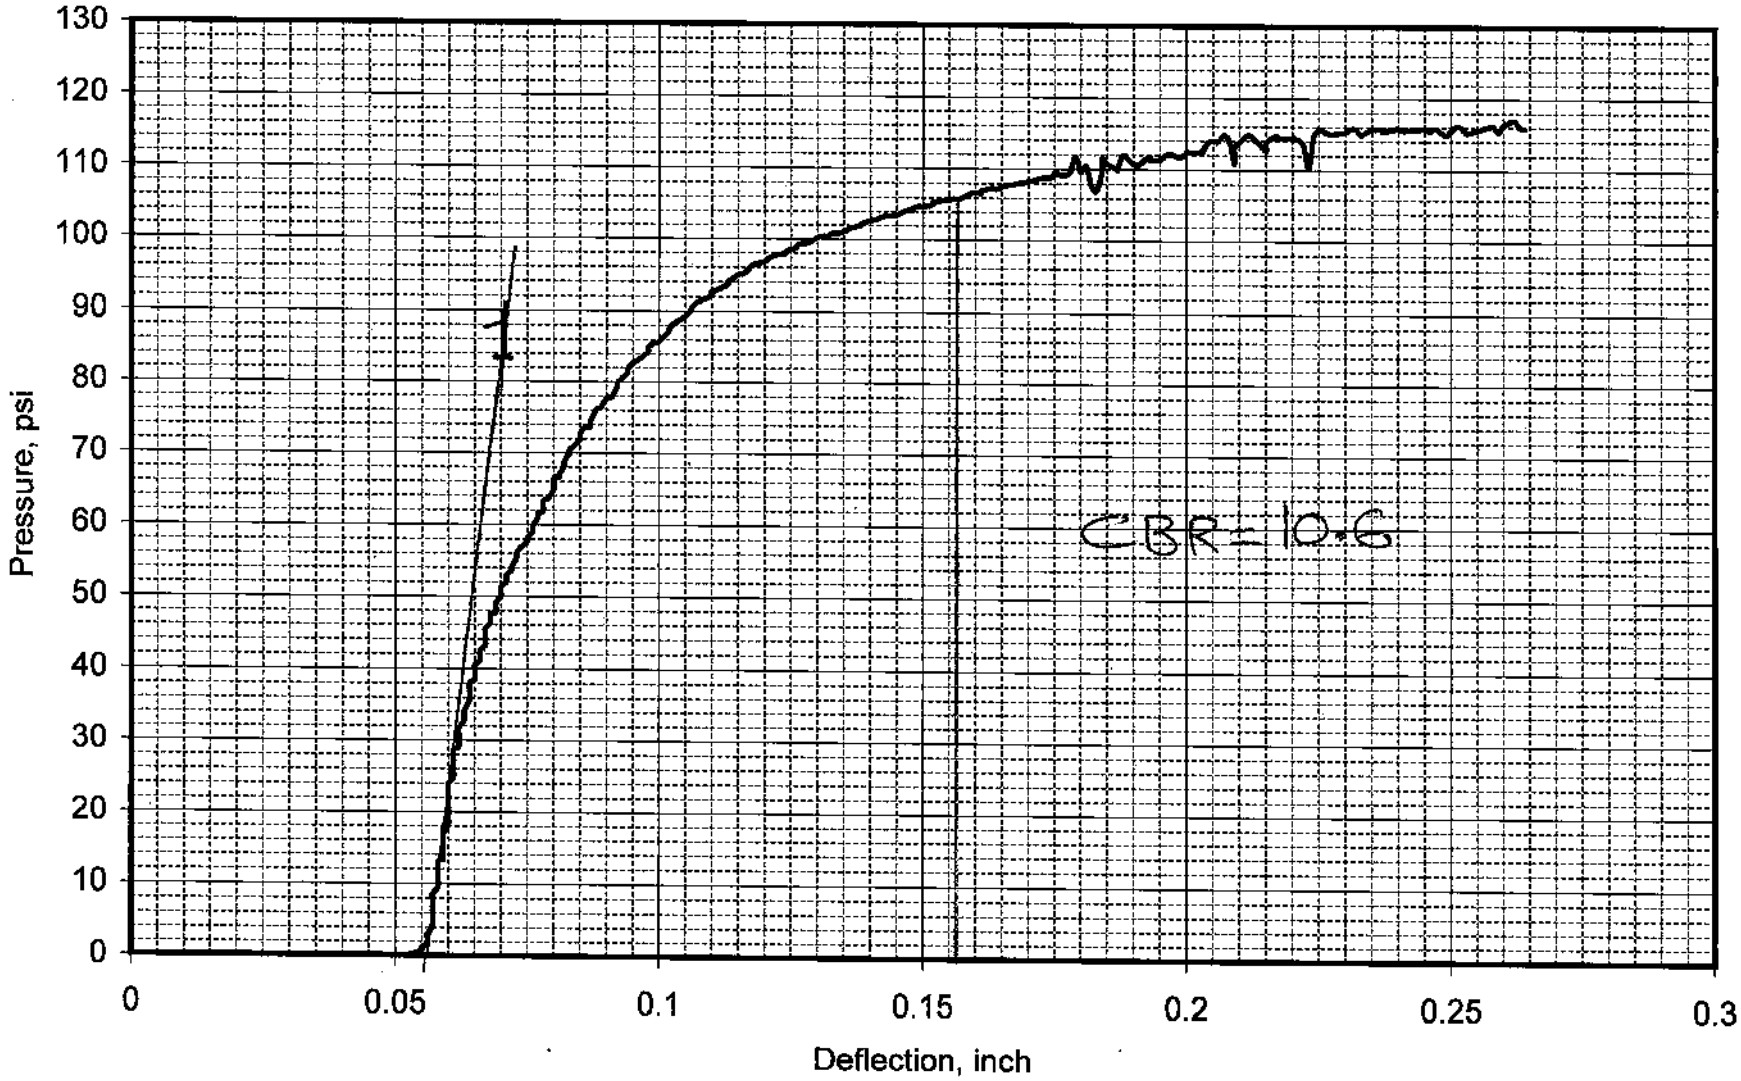

CBR 04/15/2009
CYLINDER HORIZONTAL-2

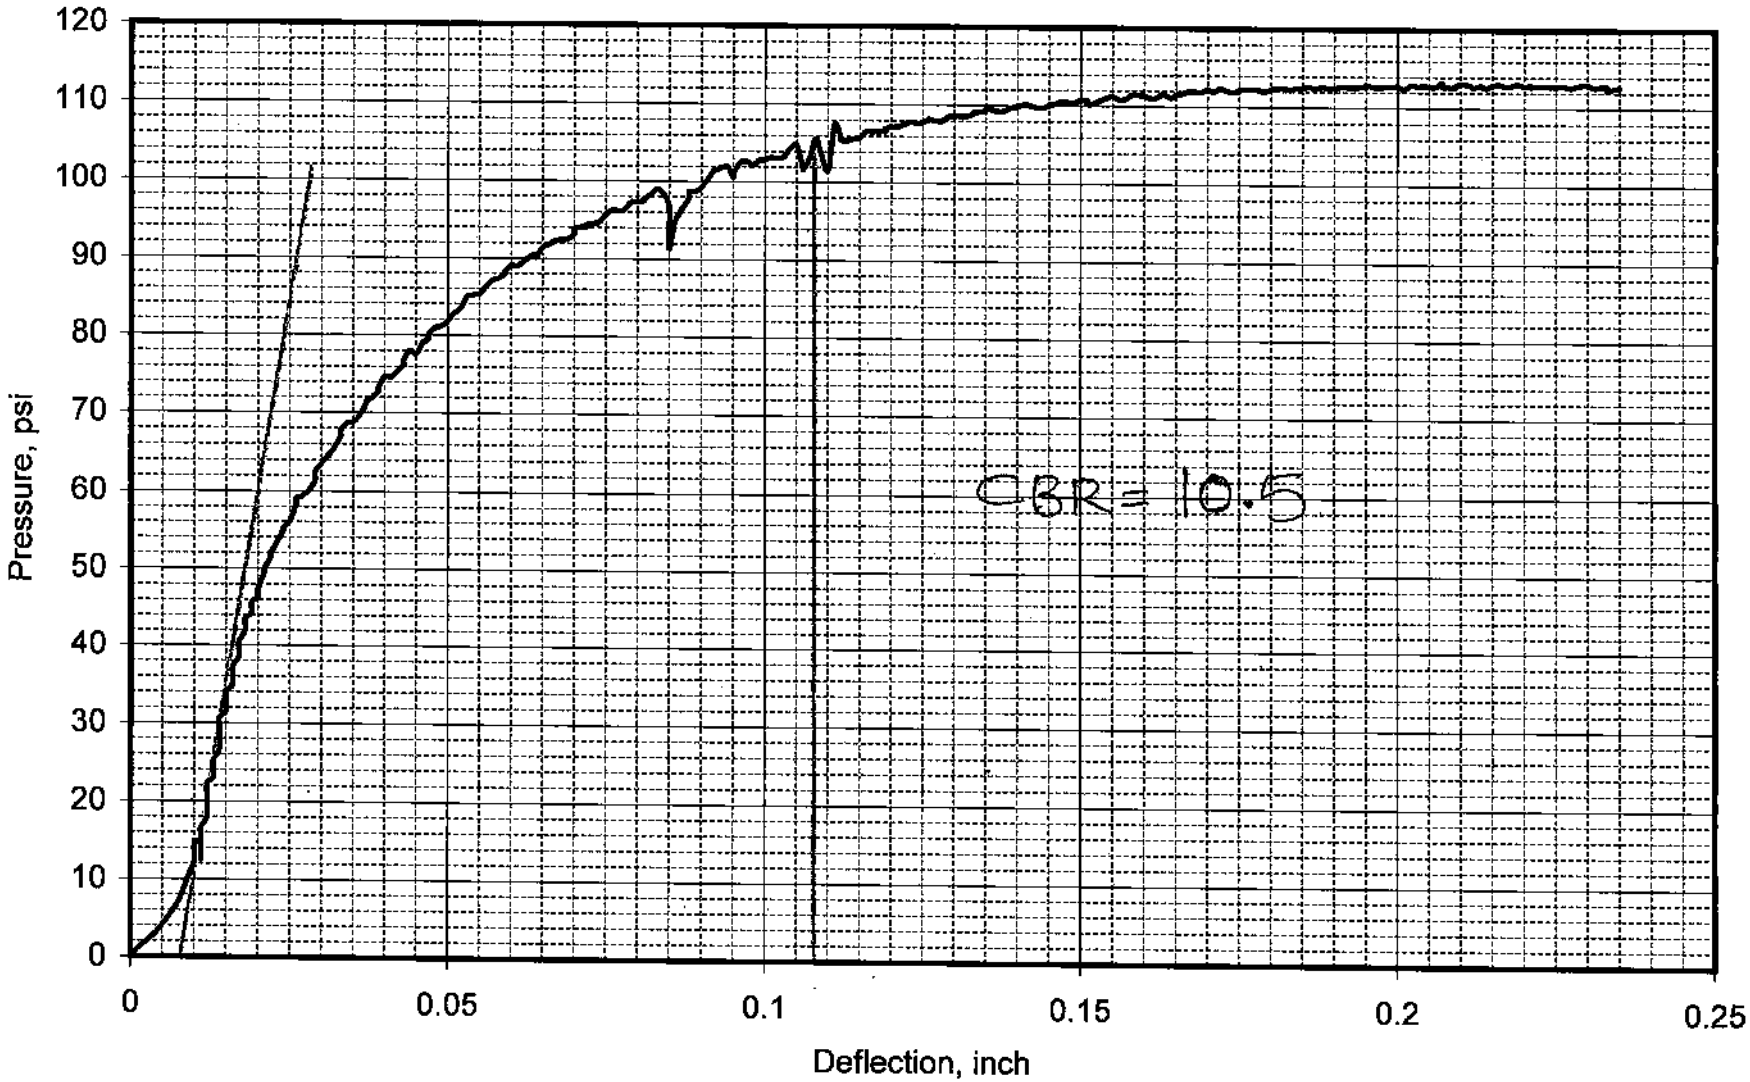

## SUMMARY OF ACCEPTANCE CBR TEST RESULTS ON CC-4 SUBGRADE TOP (1/17/06)
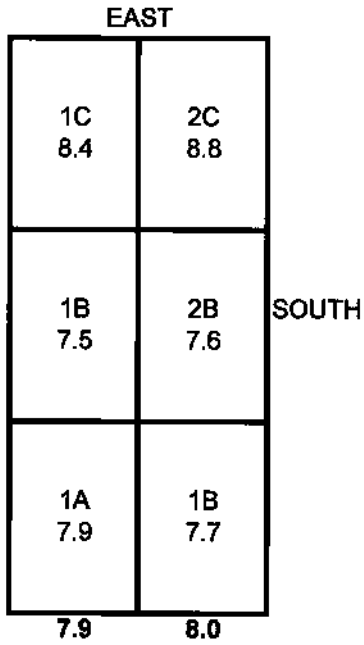
| Lot ID | Test Item | Sublot ID | Test ID | Station | Lane | CBR | Test Avg. | Lot Avg | Moisture |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lot 1 | 1 | A | 1 | 369 | North | 8.0 | 7.9 | 7.9 | |
| | | | 2 | 369 | North | 7.6 | | | 30.01 |
| | | | 3 | 369 | North | 8.1 | | | |
| | 2 | B | 1 | 464 | North | 8.2 | 7.5 | | |
| | | | 2 | 464 | North | 6.8 | | | 29.26 |
| | | | 3 | 464 | North | 7.5 | | | |
| | 3 | C | 1 | 572 | North | 9.2 | 8.4 | | |
| | | | 2 | 572 | North | 8.1 | | | 30.64 |
| | | | 3 | 572 | North | 8.0 | | | |
| Lot 2 | 1 | A | 1 | 369 | South | 7.0 | 7.7 | 8.0 | |
| | | | 2 | 369 | South | 7.5 | | | 30.04 |
| | | | 3 | 369 | South | 8.5 | | | |
| | 2 | B | 1 | 454 | South | 7.5 | 7.6 | | |
| | | | 2 | 454 | South | 7.5 | | | 29.6 |
| | | | 3 | 454 | South | 7.7 | | | |
| | 3 | C | 1 | 568 | South | 8.0 | 8.8 | | |
| | | | 2 | 568 | South | 9.0 | | | 29.45 |
| | | | 3 | 568 | South | 9.4 | | | |
